

# 甲賀市新庁舎建設工事 工事かわら版

# 2月



甲賀市の皆さま

平成27年8月より工事をスタートして1年6ヶ月が経過しました。現在、新庁舎引渡しにむけ仕上工事中です。3月末の完成まで残りわずかとなり、新庁舎工事現場ではたくさんの職人さんたちが工事を行っています。内装工事では建物内の間仕切り壁や天井仕上げ工事を進めています。工事期間中は皆さまにご迷惑をおかけしますが、安全環境に配慮しながら工事を進めてまいりますので皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。


東急・三陽特定建設工事共同企業体 所員一同

## 今後の予定

- 2月 内装仕上げ工事・外構工事  
※外部足場養生が解体され、建物周り外構工事を行います。
- 3月 3月31日の新庁舎竣工にむけ各種検査・試運転・調整・外構仕上工事などを行います。



## 全体工程

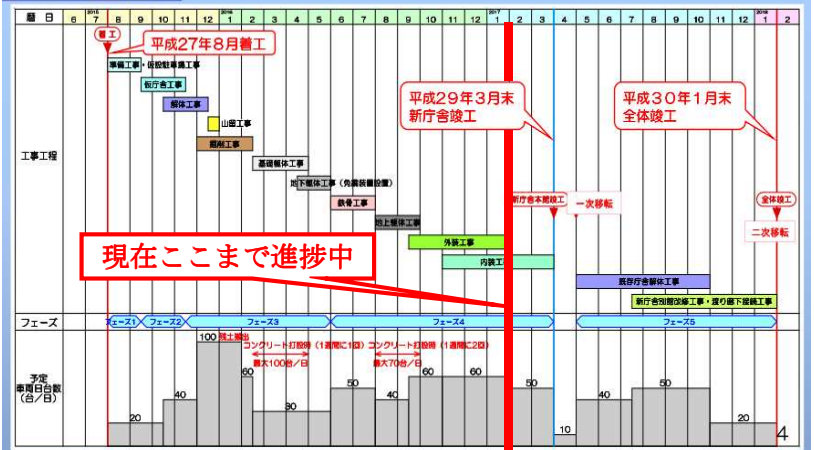

## 新舎竣工にむけて仕上げ工事を行っています

平成27年8月着工から1年6ヶ月が経過しました。新庁舎建設工事では、内・外装工事を施工中です。



吹抜施工状況



屋上太陽光パネル施工状況



天井施工状況



## 岩永市長が現場を視察



2月1日、岩永市長ほか甲賀市関係者が建設現場を訪れ、建物内部・外部の工事の進捗状況など確認されました。



現場視察状況
